



INFORME DE SUPERVISION

Código

Página

1 de 2

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15	07	2015	A	14	10	2015
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	<input type="checkbox"/>		NO	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL		100%		
					0%		

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	William Mauricio Leguizamón Mendoza
DEPENDENCIA	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
CARGO	Ing. Civil Supervisor Obra

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	1591 de 2015
FECHA DE CONTRATO	08/07/2015
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
CONTRATISTA	LEONEL VALERO ESCALANTE
C.C	80.093.391
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE, (\$178.995.987)
VALOR FINAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PLAZO	3 (Tres) Meses
FECHA ACTA DE INICIO	15/07/2015
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	14/10/2015
ADICION	N.A
PRORROGA	N.A
SUSPENSIÓN	N.A

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El contratista ejecuto las actividades contempladas en el alcance del contrato de obra 1591 de 2015, se evidencia una ejecución al 100% de cada actividad, el personal utilizado en la obra contaba con la experiencia en la ejecución de este tipo de obras, se entrega en óptimas condiciones los espacios que fueron objeto del presente contrato, el aula de expresión corporal cumple con el objeto del presente contrato, se retiran escombros y se realiza la limpieza necesaria en cada uno de los lugares intervenidos.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Satisfactoria, se cumple con el objeto contractual, no se presentan inconvenientes durante el desarrollo de las actividades contratadas. Se cumple con el tiempo estipulado en la duración del contrato, el personal que labora se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

	INFORME DE SUPERVISION	Código	
		Página	2 de 2

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.	Calidad de los trabajos		X				
2.	Duracion del contrato		X				
3.	Seguridad social Rp del personal		X				
4.	Elaboración de actas		X				
5	Ejecucion de las actividades		X				
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			X				

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

No se presentan sugerencias

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

No se encuentran mejoras

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

El contratista allega copia de pago de seguridad social del personal utilizado en el presente contrato.

7. MANEJO DE LOS RECURSOS:

Se realizó un anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato con el cual el contratista realiza la compra de materiales necesarios para la ejecución de las actividades, igualmente realiza el pago de la mano de obra del personal que labora en la misma, se observa un buen manejo de los recursos, se entrega copia del seguimiento al buen manejo del anticipo con los soportes necesarios, no se presentaron atrasos por falta de materiales o de personal.

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN.

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:			
Se anexa CD y documento fisico con el informe del contratista.			

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2015


ING. WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMÓN
SUPERVISOR

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA E INFORMES SEMANALES

	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CÓDIGO				
		VERSIÓN				
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA			PÁGINA	1	DE	
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA				1		

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FECHA 18 7 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 1 Del: 15/07/2015 Al: 18/07/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 5,74	5,74	Obra Física Ejecutada (%) 5,74	5,74
Valor básico de la Obra \$ 7.803.175	\$ 7.803.175	Valor básico de la Obra \$ 7.803.175	\$ 7.803.175

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: LEONEL VALERO
 Contrato No. 1591/2015
 Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
 Valor Actualizado: \$
 Plazo Inicial: Tres (3) meses
 Plazo Actualizado:
 Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:
 Contrato No. 1591/2015
 Valor Inicial:
 Valor Actualizado:
 Plazo Inicial: Tres (3) meses
 Plazo Actualizado:
 Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades de localizacion y replanteo, cerramiento con poli sombra,desmonte y retiro de escombros, tala y retiro de arboles y demolicion de poste.

Durante esta se realizaron actividades de excavación, cimiento en ciclopeo en formaleta; zapata en concreto de 21Mpa de los ejes 1-A; 1-C; 1-E; 2-A; 2-C; 2-E; 4-A; 4-E; 5-A; 5-C; 5-E. pedestal de columna 0,25*0,25 de 21Mpa en los ejes 1-A; 1-C; 1-E; 2-A; 2-C; 2-E; 4-A; 4-E; 5-A; 5-C; 5-E.
 se subio material arena, triturado, hierro.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: , excavacion manual , Relleno material de excavacion
 Viga sobre cimiento concreto 21 Mpa 0.25x0.25 m

subir material a la obra

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

los trabajadores deben subir todo el material hacia el lugar de la obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma 
 Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON
 Matricula No. 5420207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA N°. 01
18 DE JULIO DE 2015 VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA N°.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE8 EN LA EXTENSION
DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

1 DE 2



Foto N°. 01 Fecha: 15/07/2015

LOCALIZACION Y REPLANTEO

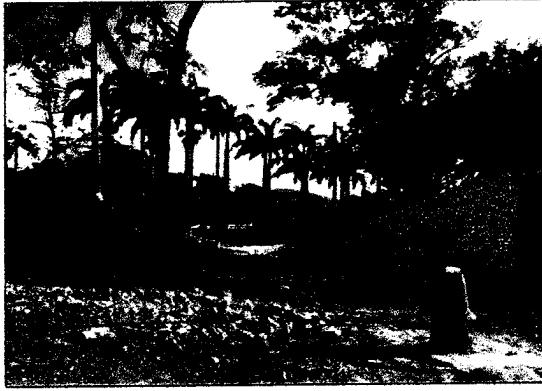


Foto N°. 02 Fecha: 15/07/2015

CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA



Foto N°. 03 Fecha: 15/07/2015

DESMONTE Y LIMPIEZA



Foto N°. 04 Fecha: 15/07/2015

TALA Y RETIRO DE ARBOLES

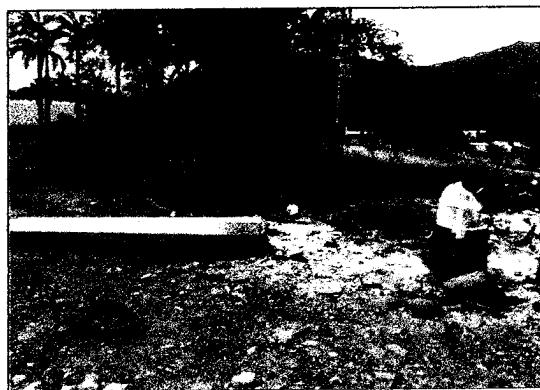




Foto N°. 05 Fecha: 15/07/2015

RETIRO Y DEMOLICION DE POSTE






Foto N°. 06 Fecha: 15/07/2015

EXCAVACION MANUAL

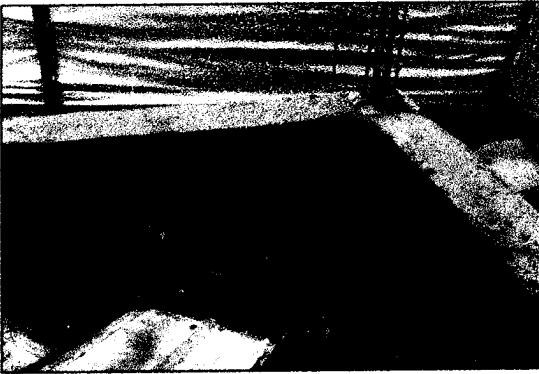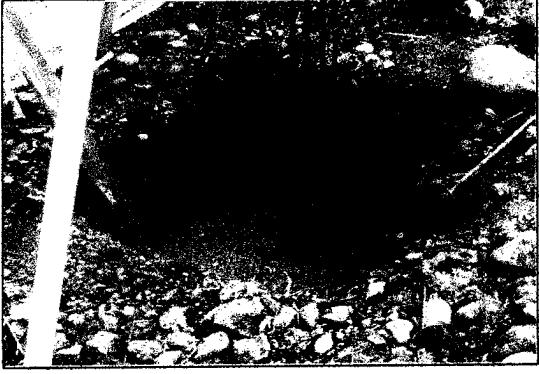	REGISTRO FOTOGRÁFICO		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°. 01 18 DE JULIO DE 2015 VERSIÓN 0
	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		
CONTRATO DE OBRA N°.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.			PAGINA
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER			2 DE 2
	Foto No. 07 Fecha: 16/07/2015	PROCESO DE CIMENTO CICLOPEO	
			Foto No. 08 Fecha: 16/07/2015
		CIMENTO CICLOPEO EN FORMALETA	
	Foto No. 09 Fecha: 16/07/2015	ZAPATA EN CONCRETO	
			Foto No. 10 Fecha: 17/07/2015
		PEDESTAL DE COLUMNA 15° 25 (21 Mpa con ref.)	



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA	CÓDIGO				
	VERSIÓN				
	PÁGINA	1	DE	1	
	FECHA	25	7	2015	
DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CONTRATO N°: 1591/2015				
UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander	AI: 25/07/2015				
Semana Número: 2 Del: 20/07/2015	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días				
Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:					
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA. CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.					
Obra programada (%) Valor básico de la Obra	SEMANAL 2,80 \$ 3.807.086	ACUMULADO 8,54 \$ 11.610.261	Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra	SEMANAL 2,8,0 \$ 3.807.086	ACUMULADO 8,54 \$ 11.610.261
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENCIÓN:			
Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE Contrato No. 1591/2015 Valor Inicial: \$ 178.995.987,00 Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Tres (3) meses Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015	Interventor: Contrato No. 1591/2015 Valor Inicial: Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Tres (3) meses Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
Durante esta se realizaron actividades como viga sobre cimiento 0,25*0,25 de 21 Mpa; levanto muro en bloque No 5. se subio material arena, triturado.					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
En la siguiente semana según la programación del contratista se realizaran las siguientes actividades: relleno para piso material prestamo; construcción de ante piso e= 0,06 con malla; instalación de aguas lluvias; instalación de tubería eléctrica. subir material a la obra					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO					
OBSERVACIONES		DIRECTOR DE INTERVENCIÓN			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		Firma Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON Matrícula No. 5420207923 NTS			
ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA DE VISITA					

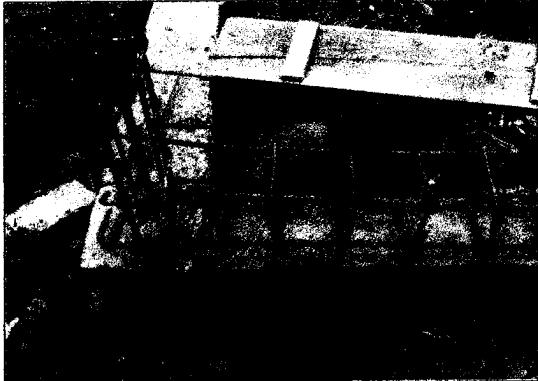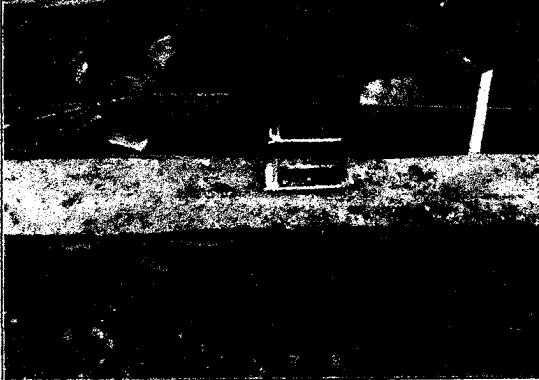	REGISTRO FOTOGRÁFICO		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 02 25 DE JULIO DE 2015 VERSIÓN 0		
	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA				
	CONTRATO DE OBRA No.1891 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.				
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA			
	1	DE	1		
	Foto No. 01 Fecha: 23/07/2015	VIGA DE SOBRECIMIENTO 25x25 (21 Mpa con ref.)		Foto No. 02 Fecha: 23/07/2015	VIGA DE SOBRECIMIENTO 25x25 (21 Mpa con ref.)
	Foto No. 03 Fecha: 23/07/2015	VIGA DE SOBRECIMIENTO 25x25 (21 Mpa con ref.)		Foto No. 04 Fecha: 23/07/2015	VIGA DE SOBRECIMIENTO 25x25 (21 Mpa con ref.)
	Foto No. 05 Fecha: 23/07/2015	MURO EN BLOQUE No 5		Foto No. 06 Fecha: 24/07/2015	MURO EN BLOQUE No 5





UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CÓDIGO			
	VERSIÓN			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA	PÁGINA	1	DE	1
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA				

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FECHA 1 8 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 3 Del: 27/07/2015 AI: 01/08/2015
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 18 Días
Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.
CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 6,00	14,54	Obra Física Ejecutada (%) 6,00	14,54
Valor básico de la Obra \$ 8.158.290	\$ 19.768.551	Valor básico de la Obra \$ 8.158.290	\$ 19.768.551

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
Valor Actualizado: \$
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial:
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades de relleno con material seleccionado de excavación; instalacion tuberia de aguas lluvias D = 4"; instalacion de tuberia electrica; relleno para piso material prestamo (base); construcion de antepiso e=0,06 con malla; demolicion de sardinel.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: ,viga sobre muro 12*30; columna 15*25; columna de confinamiento 12*25; muro en bloque # 5. subida de material arena, triturado, boque.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	<p>Firma </p> <p>Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMÓN Matrícula No. 5420207928 NTS</p>

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 03 01 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1891 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA
		1 DE 2



Foto No. 01 Fecha: 27/07/2015
RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION



Foto No. 02 Fecha: 28/07/2015
RELENO PARA PISO MATERIAL PRESTAMO (BASE)



Foto No. 03 Fecha: 29/07/2015
COMPACTACION DE RELLENO



Foto No. 04 Fecha: 29/07/2015
COMPACTACION DE RELLENO

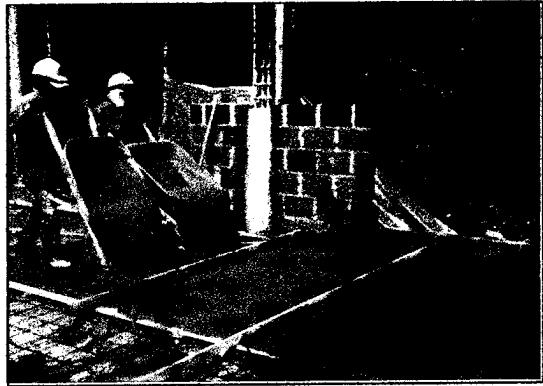


Foto No. 05 Fecha: 30/07/2015
CONSTRUCCION DE ANTEPISO #=0,06 CON MALLA


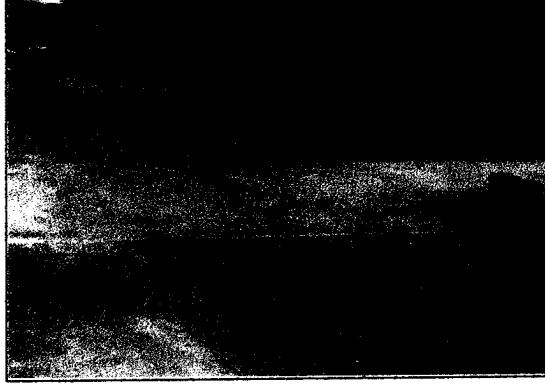


Foto No. 06 Fecha: 31/07/2015
DEMOLICION DE SARDINEL



	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 03 01 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA
	2	DE
	2	

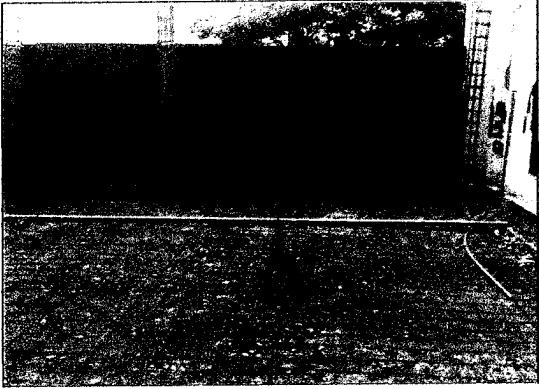


Foto No. 07 Fecha: 30/08/2015

INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA




Foto No. 08 Fecha: 01/08/2015

DEMOLICION DE SARDINEL

Cuad



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA

8 8 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 4 Del: 03/08/2015

Al: 08/08/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 25 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
	5,61	20,15
Valor básico de la Obra	\$ 7.632.481	\$ 27.401.033

Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
	5,61	20,15

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Contratista:	LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato No.	1591/2015
Valor Inicial:	\$ 178.995.987,00
Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento:	15 de octubre del 2015

Interventor:	
Contrato No.	1591/2015
Valor Inicial:	\$
Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento:	15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades columnas de confinamiento 0,10*0,25 21 Mpa con ref; columnas 0,15*0,25 ; viga sobremuro 0,10*0,25 21 Mpa con ref muro en bloque no 5

se subio material arena, triturado, hierro.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: , placa masiva de acceso 2,19*4,30; viga canal; 8,03*60 viga de cubierta; instalacion de gargolas.
subir material

RECUERDO GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Firma
Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON
Matricula No. 5420207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA N° 04
08 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA N° 1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

1 DE 1

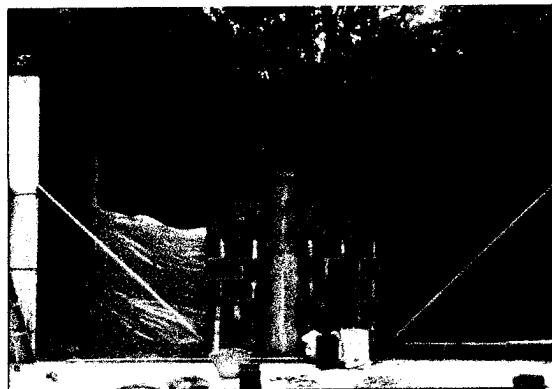


Foto No. 01 Fecha: 04/08/2015

COLUMNA 15*25 (21Mpa con ref.)



Foto No. 02 Fecha: 05/08/2015

COLUMNA DE CONFINAMIENTO 15*25 (21Mpa con ref.)



Foto No. 03 Fecha: 05/08/2015

VIGA SOBRE MURO 10*25 (21Mpa con ref.)



Foto No. 04 Fecha: 05/08/2015

VIGA SOBRE MURO 10*25 (21Mpa con ref.)



Foto No. 05 Fecha: 06/08/2015

MURO BLOQUE N 5



Foto No. 06 Fecha: 07/08/2015

MURO BLOQUE N 5

Quesada



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA

15 8 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander

CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 5 Del: 10/08/2015

Al: 15/08/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 32 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 4,08	24,23
Valor básico de la Obra \$ 5.553.193	\$ 32.954.226

SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%) 4,08	24,23
Valor básico de la Obra \$ 5.553.193	\$ 32.954.226

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
Valor Actualizado: \$
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

Interventor:
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$
Valor Actualizado: \$
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades placa masiva H= 0,15m(ref.) con anclajes fijados y sikadur-31 adhesivo, fundido y mezclado con plastocrete dm impermeabilizante integral para mezcla de concreto; viga canal fundida y mezclado con plastocrete dm; funde viga cubierta 0,15*0,25 (21MPa con ref.) instalacion de gargolas se subio material arena, triturado.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA Siguiente SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: , muro en bloque no 5; pañete liso muro 1:4; pañete liso placa 1:3

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
 Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMÓN
 Matrícula No. 54202207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 05
15 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

1 DE 2

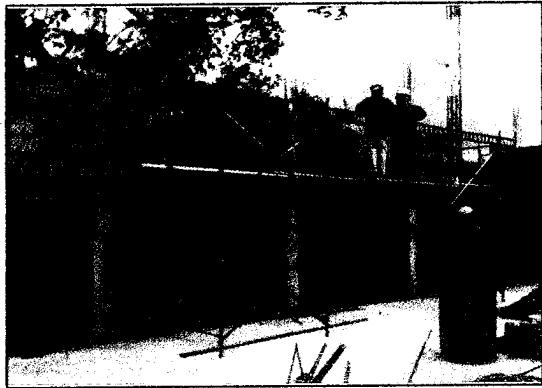


Foto No. 01 Fecha: 10/08/2015

VIGA CUBIERTA 15*25 (21Mpa con ref.)




Foto No. 02 Fecha: 14/08/2015

VIGA CUBIERTA 15*25 (21Mpa con ref.)

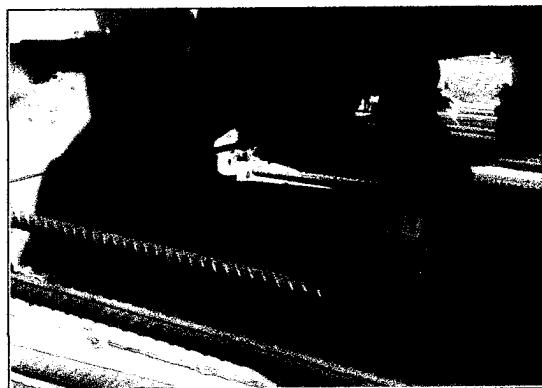


Foto No. 03 Fecha: 12/08/2015

ANCLAJES CON ADHESIVO EPOXICO PAR PLACA DE ACCESO

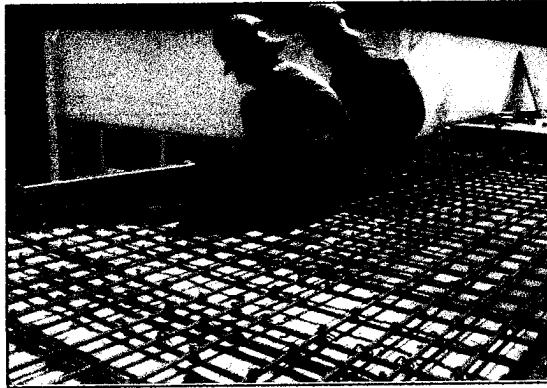


Foto No. 04 Fecha: 13/08/2015

PLACA DE ACCESO

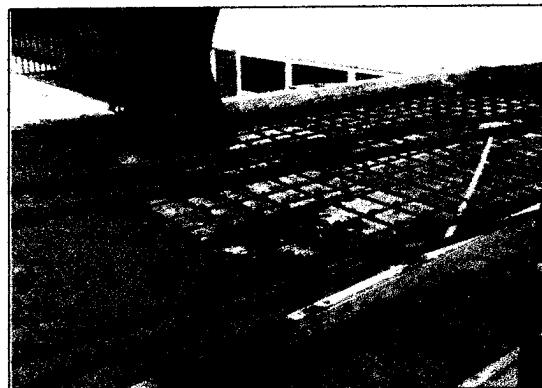


Foto No. 05 Fecha: 14/08/2015

PLACA DE ACCESO

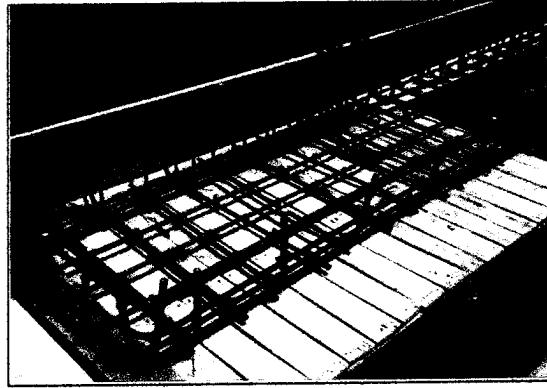


Foto No. 06 Fecha: 12/08/2015

VIGA CANAL

[Signature]

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 05 15 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0	
	CONTRATO DE OBRA No.1891 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.		
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA	
	2	DE	2

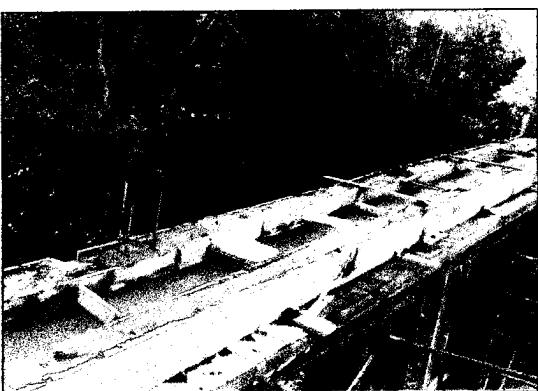


Foto No. 07 Fecha: 14/08/2015

VIGA CANAL

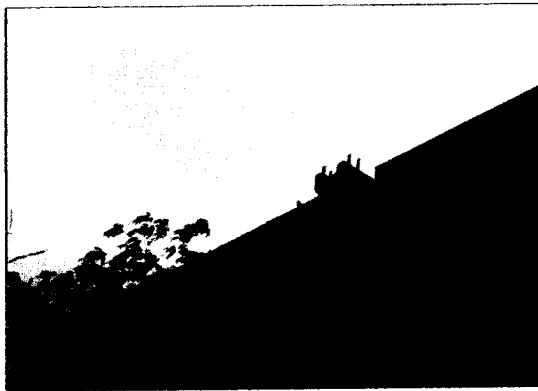


Foto No. 08 Fecha: 14/08/2015

INSTALACION DE GARGOLAS

Cult.



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 22 8 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 6 Del: 17/08/2015

Al: 22/08/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 39 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 2,17	36,29	Obra Física Ejecutada (%) 2,17	36,29
Valor básico de la Obra \$ 2.944.820	\$ 35.899.046	Valor básico de la Obra \$ 2.944.820	\$ 35.899.046

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
 Contrato No: 1591/2015
 Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
 Valor Actualizado: \$
 Plazo Inicial: Tres (3) meses
 Plazo Actualizado:
 Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

Interventor:
 Contrato No. 1591/2015
 Valor Inicial:
 Valor Actualizado:
 Plazo Inicial:
 Plazo Actualizado:
 Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades: columna; muro en bloque No 5, pañete de muro 1:4, filos y dilataciones , tuberia para desague de aire.

se subio material arena, triturado bloque.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: , muro en bloque no 5; comunas; viga cubierta 15*30; pañete muro liso; filos dilataciones; borde en ventanas; muro con ladrillo de obra.
subida de material

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
 Nombre: ING-WILLIAM LEGUIZAMON
 Matrícula No. 54202207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 08
22 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA N°.1891 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

1 DE 1



Foto No. 01 Fecha: 18/08/2015

PAÑETE

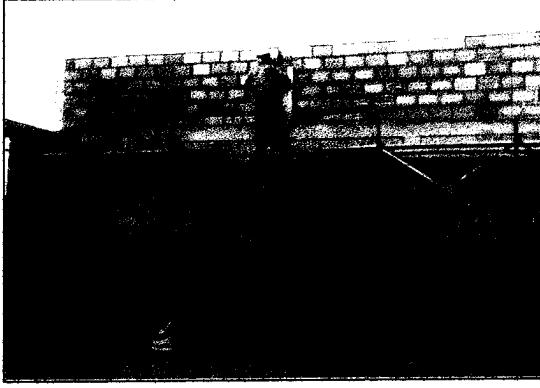


Foto No. 02 Fecha: 18/08/2015

COLUMNA

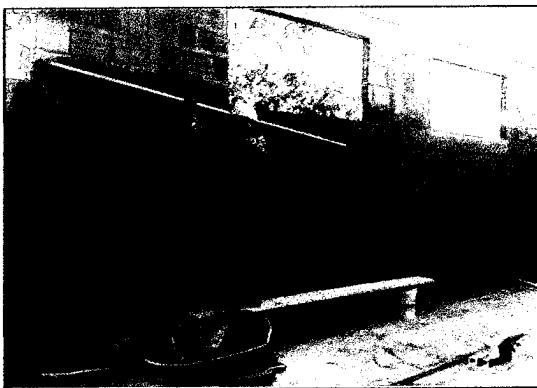


Foto No. 03 Fecha: 21/08/2015

DILATACIONES



Foto No. 04 Fecha: 20/08/2015

SUBIDA DE MATERIAL



Foto No. 05 Fecha: 21/08/2015

PAÑETE MURO



Foto No. 06 Fecha: 22/08/2015

TUBERIA DESAGÜE DE AIRES

Perd

	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		CÓDIGO															
			VERSIÓN															
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA		PÁGINA	1	DE	1												
	INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA																	
DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA			FECHA	29	8	2015												
UBICACIÓN: Autopista Internacional , Villa del Rosario - Norte de Santander			CONTRATO No: 1591/2015															
Semana Número: 7 Del: 24/08/2015 Al: 29/08/2015																		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 46 Días																		
Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamon Mendoza																		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA																		
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.																		
CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">SEMANAL</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">ACUMULADO</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">SEMANAL</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obra programada (%) 3,90</td> <td>30,30</td> <td>Obra Física Ejecutada (%) 3,90</td> <td>30,30</td> </tr> <tr> <td>Valor básico de la Obra \$ 5.308.179</td> <td>\$ 41.207.226</td> <td>Valor básico de la Obra \$ 5.308.179</td> <td>\$ 41.207.226</td> </tr> </tbody> </table>							SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	Obra programada (%) 3,90	30,30	Obra Física Ejecutada (%) 3,90	30,30	Valor básico de la Obra \$ 5.308.179	\$ 41.207.226	Valor básico de la Obra \$ 5.308.179	\$ 41.207.226
SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO															
Obra programada (%) 3,90	30,30	Obra Física Ejecutada (%) 3,90	30,30															
Valor básico de la Obra \$ 5.308.179	\$ 41.207.226	Valor básico de la Obra \$ 5.308.179	\$ 41.207.226															
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENCIÓN:															
<p>Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE Contrato No. 1591/2015 Valor Inicial: \$ 178.995.987,00 Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Tres (3) meses Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015</p>			<p>Interventor: Contrato No. 1591/2015 Valor Inicial: \$ Valor Actualizado: \$ Plazo Inicial: Tres (3) meses Plazo Actualizado: Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015</p>															
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																		
<p>Durante esta se realizaron actividades, muro en bloque No 5, pañete de muro 1:4, filos y dilataciones , columnas; viga de remate 15*15;excavacion manual borde en ventanas 10*08 tolta 4 unidades; tala de arbol espacio peatonal. se subio material arena, triturado bloque.</p>																		
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
<p>En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: , muro en bloque no 5; pañete liso muro 1:4; pañete liso anclaje de platina viga de remate; desmonte y limpieza; zapata 80*80; pedestal ; anclaje de platinas; muro de contencion anden en concreto; media calña en concreto.</p>																		
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO																		
OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENCIÓN														
<p>Firma  Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON Matricula No. 5420207923 NTS</p>																		
ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA																		



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA N°. 07
29 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA N°. 1691 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

1 DE 2



Foto No. 01 Fecha: 26/08/2015

MURO BLOQUE N 5



Foto No. 02 Fecha: 26/08/2015

COLUMNA

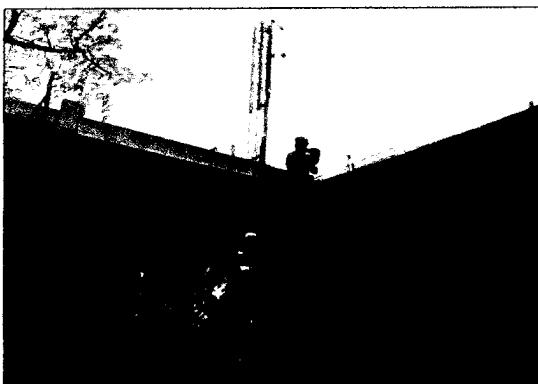


Foto No. 03 Fecha: 26/08/2015

VIGA DE REMATE 15*15



Foto No. 04 Fecha: 27/08/2015

PAÑETE



Foto No. 05 Fecha: 27/08/2015

TALA Y RETIRO DE ARBOL



Foto No. 06 Fecha: 26/08/2015

EXCAVACION MANUAL

[Signature]

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 07 29 DE AGOSTO DE 2015 VERSIÓN 0 PAGINA
	CONTRATO DE OBRA No.1691 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER	
		2 DE 2

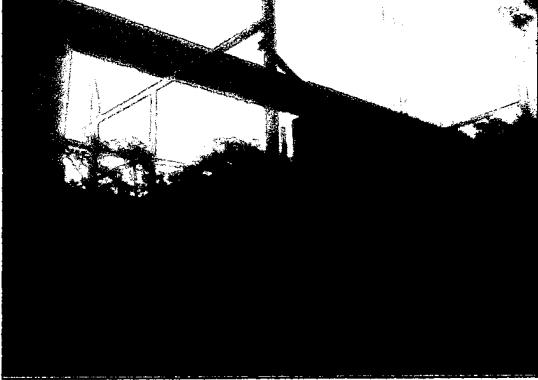


Foto No. 07 Fecha: 25/08/2015

BORDE EN VENTANAS

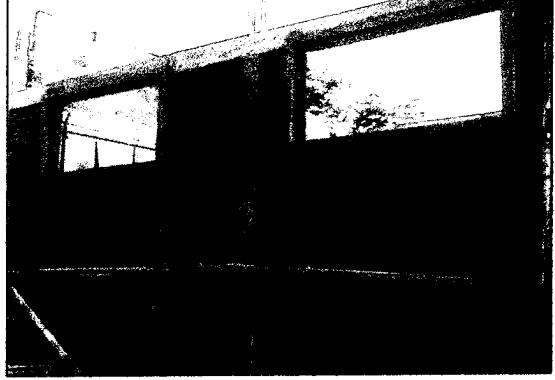


Foto No. 08 Fecha: 25/08/2015

DILATACIONES

Quesada



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

DE

1

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA

5 9 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander

CONTRATO N°: 1591/2015

Semana Número: 8 Del: 31/08/2015

Al: 05/09/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO
4,83	35,13
\$ 6.576.046	\$ 47.783.272

SEMANAL	ACUMULADO
4,83	35,13
\$ 6.576.046	\$ 47.783.272

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENCIÓN

Contratista:	LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato N°:	1591/2015
Valor Inicial:	\$ 178.995.987,00
Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento:	15 de octubre del 2015

Interventor:	
Contrato N°:	1591/2015
Valor Inicial:	\$
Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento:	15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades, zapata 80*80 ; pedestal de columna 25*25; anclaje platina metalica; relleno con material de excavacion; muro de contencion en ladrillo de obra; borde de ventanas; anden en concreto; media caña en concreto.
se subio material arena, triturado, ladrillo de obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programación del contratista se realizaran las siguientes actividades: pañete muro; pañete placa; zapata; pedestal; anclajes; viga metalica; placa en metaldeck; estructura para techo; pasta filos y dilataciones de pasta.

REVISIÓN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Firma
Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON
Matricula No. 54202207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 08
05 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

1 DE 2



Foto No. 01 Fecha: 28/08/2015

ZAPATA EN CONCRETO 80*80

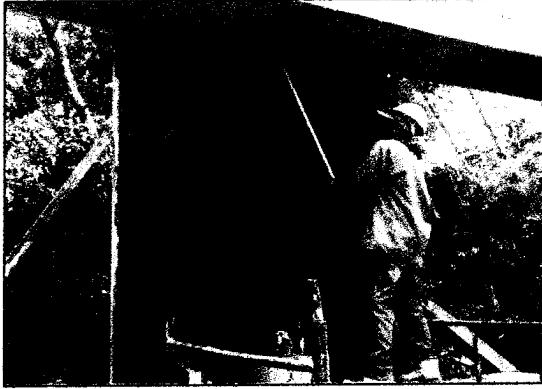


Foto No. 02 Fecha: 31/08/2015

PAÑETE MURO



Foto No. 03 Fecha: 1/09/2015

FILOS

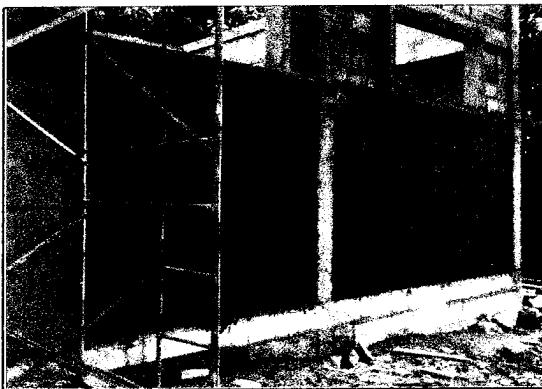


Foto No. 04 Fecha: 2/09/2015

DILATACIONES



Foto No. 05 Fecha: 2/09/2015

PEDESTAL DE COLUMNA 25*25



Foto No. 06 Fecha: 2/09/2015

ANCLAJE PLATINA METALICA

Car

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 08 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA
	2	DE
		2

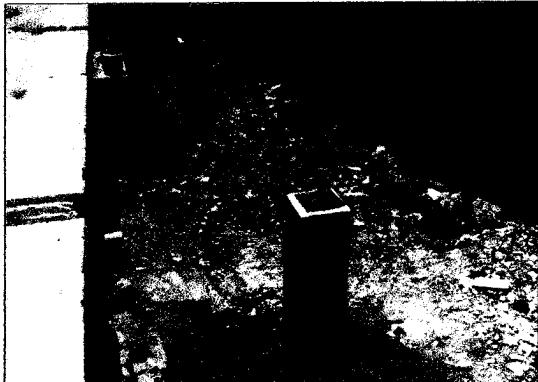


Foto No. 07 Fecha: 4/09/2015

PEDESTALES



Foto No. 08 Fecha: 4/09/2015

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN



Foto No. 09 Fecha: 3/09/2015

MURO DE CONTENCION EN LADRILLO DE OBRA



Foto No. 10 Fecha: 3/09/2015

BORDES EN VENTANAS 10*08



Foto No. 11 Fecha: 3/09/2015

ANDEN EN CONCRETO



Foto No. 12 Fecha: 5/09/2015

MEDIACANA EN CONCRETO

Act-



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CÓDIGO			
	VERSIÓN			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA	PÁGINA	1	DE	1
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA	FECHA	12	9	2015

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

UBICACIÓN: Autopista Internacional, Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 9 Del: 07/09/2015 Al: 12/09/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 60 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 16,47	51,60	Obra Física Ejecutada (%) 16,47	51,60
Valor básico de la Obra \$ 22.396.024	\$ 70.179.295	Valor básico de la Obra \$ 22.396.024	\$ 70.179.295

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
Valor Actualizado: \$ _____
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado: _____
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

Interventor:
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$ _____
Valor Actualizado: \$ _____
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado: _____
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades, anclajes para estructura de cubierta; estructura de cubierta; correas metálica para cubierta; mortero de nivelación; pañete pared; pañete placa; filos y dilataciones; corte y demolición de muros espacio peatonal; pedestal de columna; anclaje platina y viga metálica; placa en metaldeck; puesta a tierra; relleno para piso y piso en concreto espacio peatonal. subida de material triturado, arena.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programación del contratista se realizaran las siguientes actividades: techo ;pasta ;muro en ladrillo de obra; placa en metaldeck; relleno; piso en concreto.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**OBSERVACIONES****DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON
Matricula No. 54202207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 09
12 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA No.1891 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

1 DE 4




Foto No. 01 Fecha: 17/09/2015

ANCLAJES ESTRUCTURA DE CUBIERTA



Foto No. 02 Fecha: 07/09/2015

ESTRUCTURA EN PERFIL C 220*80



Foto No. 03 Fecha: 27/09/2015

MORTERO DE NIVELACION



Foto No. 04 Fecha: 7/09/2015

FILOS Y DILATACIONES



Foto No. 05 Fecha: 8/09/2015

CORTE Y DEMOLICION DE MUROS



Foto No. 06 Fecha: 8/09/2015

ANCLAJES VIGA METALICA AL MURO EXISTENTE

✓nd.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 09
12 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA No.1891 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

PAGINA

2 DE 4



Foto No. 07 Fecha: 8/09/2015

PEDESTAL DE COLUMNAS DE 25x25



Foto No. 08 Fecha: 8/09/2015

ANCLAJE DE PLATINA METALICA



Foto No. 09 Fecha: 7/09/2015

PAÑETE MURO



Foto No. 10 Fecha: 8/09/2015

CORTE Y DEMOLICION DE MURO



Foto No. 11 Fecha: 9/09/2015

CORREA TUBO RECT 3'1 1/2 C:16

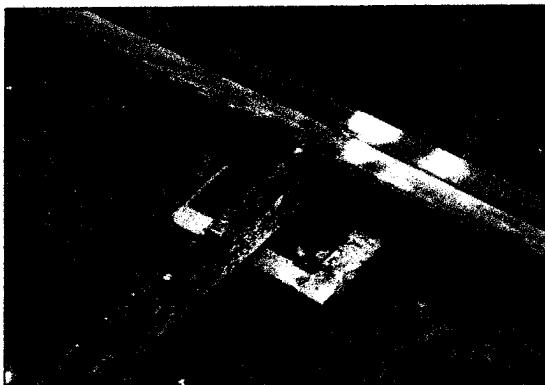


Foto No. 12 Fecha: 9/09/2015

ANCLAJE PLATINA METALICA A VIGA METALICA

Ded

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 09 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
	UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLANOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER	PAGINA 3 DE 4



Foto No. 13 Fecha: 10/09/2015

CORTE DEL METALDEK



Foto No. 14 Fecha: 10/09/2015

LAMINA DE METALDECK MALLA ELECTROSOLDADA



Foto No. 15 Fecha: 10/09/2015

PLACA EN METALDECK ESPACIO PEATONAL



Foto No. 16 Fecha: 10/09/2015

PUESTA A TIERRA



Foto No. 17 Fecha: 10/09/2015

CORTE DEMOLICIÓN DE MURO



Foto No. 18 Fecha: 10/09/2015

RELLENO PARA PISO (BASE)

Caro

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 09 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No. 1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
	UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER	

4 DE 4



Foto No. 19 Fecha: 11/09/2015
PISO EN CONCRETO 0.05M

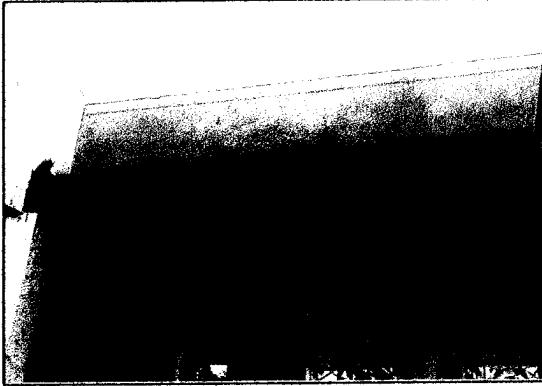


Foto No. 20 Fecha: 10/09/2015
PAÑETE PLACA



Foto No. 21 Fecha: 11/09/2015
PAÑETE PARED

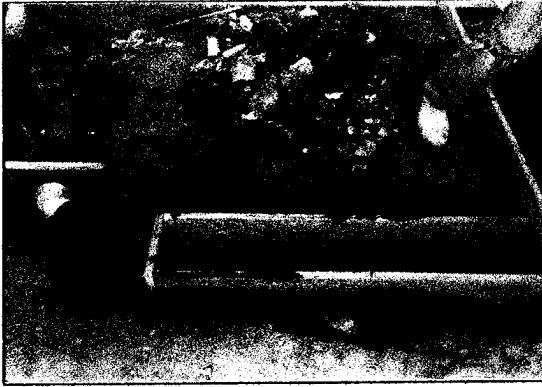


Foto No. 22 Fecha: 12/09/2015
CARCAMO ACCESO AL SALON

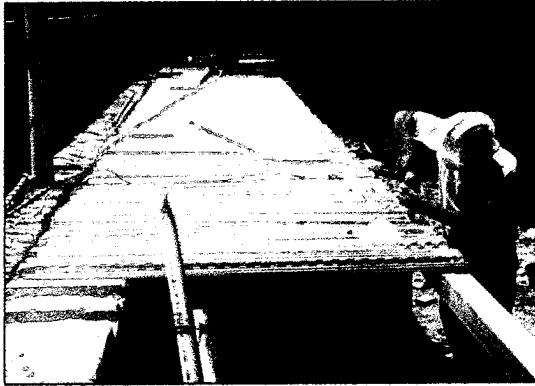


Foto No. 23 Fecha: 12/09/2015
INSTALACION LAMINA DE METAL DECK



Foto No. 24 Fecha: 12/09/2015
CORTE Y DEMOLICION DE MURO

Cuentas



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CÓDIGO			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA	VERSIÓN			
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 19 9 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional , Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 10 Del: 14/09/2015 Al: 19/09/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 67 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 9,13	60,73	Obra Física Ejecutada (%) 9,13	60,73
Valor básico de la Obra \$ 12.419.497	\$ 82.598.792	Valor básico de la Obra \$ 12.419.497	\$ 82.598.792

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
Valor Actualizado: \$
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

Interventor:
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial:
Valor Actualizado:
Plazo Inicial:
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades: techado el salon lamina termoacustica; se elabora mediacaña en concreto; se levanta muro en ladrillo a la obra; se funde piso de acceso al salon; sardinel en concreto; aplica pasta acrílica; se funde placa en metaldeck espacio peatonal; base para relleno espacio peatonal; peatonal funde piso en concreto para espacio peatonal; traslado poste de luz metálico.
se sube material arena, triturado, cubierta.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programación del contratista se realizaran las siguientes actividades: fundir placa para locker, pañete, estuco; placa gris basalto perforar huecos para lamparas y retiro de escombros.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Firma Nombre: ING. WILLIAM LEGUIZAMÓN Matrícula No. 5420207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON FECHA DE VISITA



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

**INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 10
19 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VERSIÓN 0**

CONTRATO DE OBRA No.1691 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFOQUE EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

1 DE 3

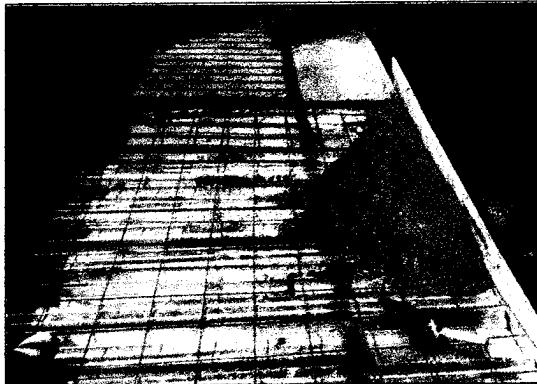


Foto No. 01 Fecha: 17/08/2015

PLACA EN METALDECK



Foto No. 02 Fecha: 14/09/2015

PLACA EN METAL DECK

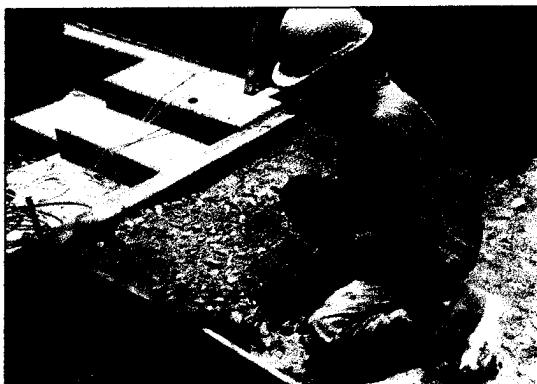


Foto No. 03 Fecha: 14/09/2015

RELENO PARA PISO (BASE)



Foto No. 04 Fecha: 14/09/2015

PISO EN CONCRETO 0.05M



Foto № 05, Ефект: 14/09/2016

PISO EN CONCRETO 0.05M



Foto № 08 Fecha: 14/09/2015

PINTURA KORAZA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN 0	
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.		
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PÁGINA	
	2	DE	3



Foto No. 07 Fecha: 20/08/2015
SUBIDA DE MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA



Foto No. 08 Fecha: 15/09/2015
SARDINEL EN CONCRETO

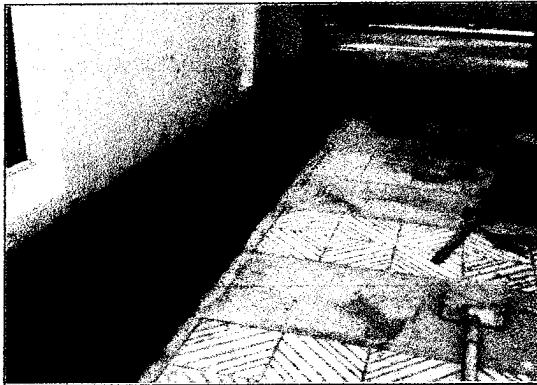


Foto No. 09 Fecha: 21/08/2015
ANDEN EN CONCRETO e =0.10 M

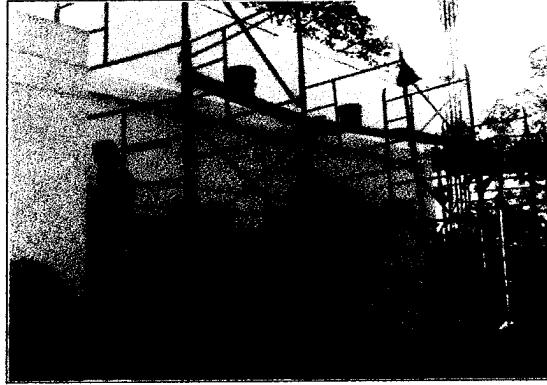


Foto No. 10 Fecha: 15/09/2015
PASTA ACRILICA



Foto No. 11 Fecha: 16/09/2015
TECHO LAMINA TERMOACÚSTICA



Foto No. 12 Fecha: 18/09/2015
MEDIA CAÑA EN CONCRETO

Ded.

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
	UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER	PAGINA 3 DE 3

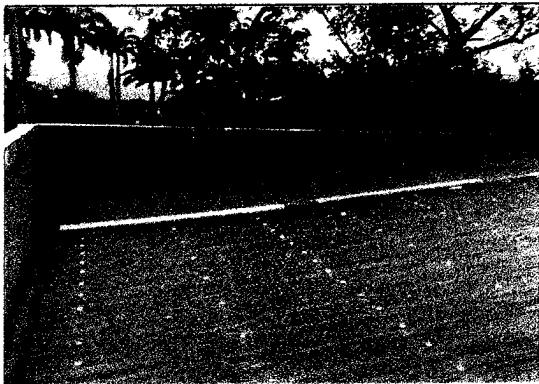


Foto No. 13 Fecha: 18/09/2015
MEDIA CAÑA EN CONCRETO

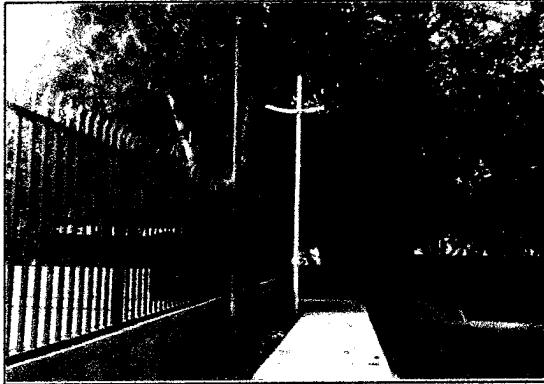


Foto No. 14 Fecha: 18/09/2015
TRASLADO POSTE DE LUZ METÁLICO



Foto No. 15 Fecha: 18/09/2015
ESTRUCTURA DE DRYWALL



Foto No. 16 Fecha: 18/09/2015
MURO EN LADRILLO DE OBRA



Foto No. 17 Fecha: 19/09/2015
CORTE DEMOLICIÓN DE MURO Y ANCLAJES




Foto No. 18 Fecha: 19/09/2015
ESTRUCTURA PARA PLACA ELEVADA DE LOCKER

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		CÓDIGO			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA		VERSIÓN			
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA		PÁGINA	1	DE	1
DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		FECHA	26	9	2015

UBICACIÓN:	Autopista Internacional , Villa del Rosario - Norte de Santander	CONTRATO No.:	1591/2015
------------	--	---------------	-----------

Semana Número:	11	Del:	21/09/2015	Al:	26/09/2015
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	74	Días			
Supervisor de Contrato	Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.
CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,87	Obra Física Ejecutada (%)	5,87
Valor básico de la Obra	\$ 7.978.925	Valor básico de la Obra	\$ 7.978.925

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
Valor Actualizado: \$
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

Interventor:
Contrato No. 1591/2015
Valor Inicial:
Valor Actualizado:
Plazo Inicial: Tres (3) meses
Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades, trabajos electrico tuberia y cable; placa elevada del locker 2,05*1,10; paquete; inicio de estuco; pintura koraza pared exterior; traslado templete de antena; retiro de escombros; acometida electrica; inician instalar laminas de drywall; perforan huecos de 60*60 para lamparas ; aplican gris basalto al ciclopeo y viga sobrecreimiento.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: instalacion de piso laminado; instalacion de puerta de vidrio; instalacion de ventanas y espejo biselado.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Firma: Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON Matrícula No. 5420207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA



REGISTRO FOTOGRÁFICO
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

INFORME SEMANAL DE
INTERVENTORIA No. 11
26 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER

1 DE 2




Foto No. 01 Fecha: 21/09/2015

TRABAJO ELECTRICO



Foto No. 02 Fecha: 21/09/2015

PLACA ELEVADA PARA LOCKER H:0,07M REF)




Foto No. 03 Fecha: 21/09/2015

INSTALACION TUBERIA ELECTRICA



Foto No. 04 Fecha: 21/09/2015

PAÑETE



Foto No. 05 Fecha: 22/09/2015

ESTUCO

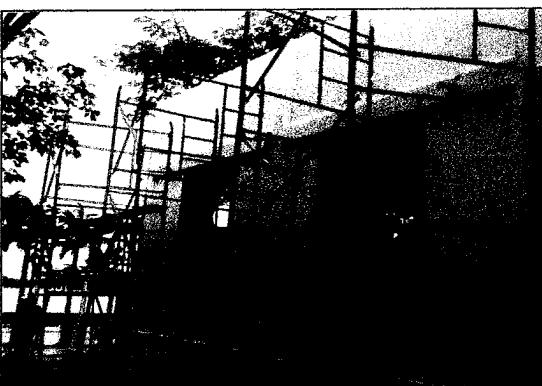


Foto No. 06 Fecha: 22/09/2015

PINTURA KORAZA

Verde

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA
		2

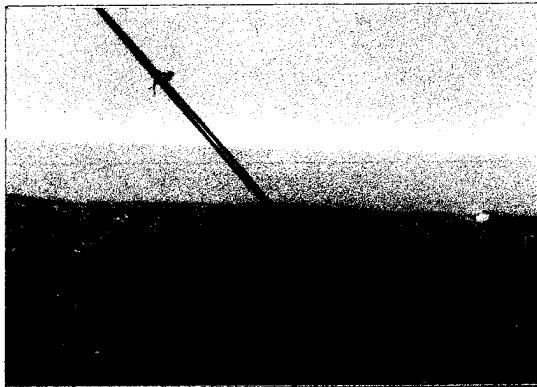


Foto No. 07 Fecha: 20/09/2015
TRASLADO TEMPLATE DE ANTENA



Foto No. 08 Fecha: 22/09/2015
RETIRO DE ESCOMBROS

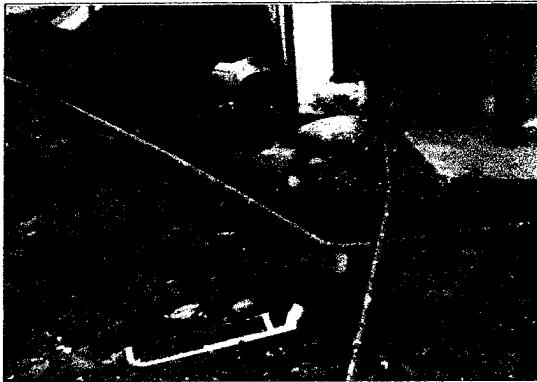


Foto No. 09 Fecha: 22/09/2015
ACOMETIDA ELECTRICA

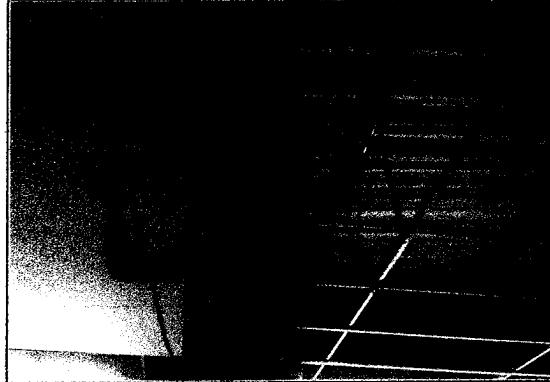


Foto No. 10 Fecha: 22/09/2015
CIELO SARO EN DRYWALL

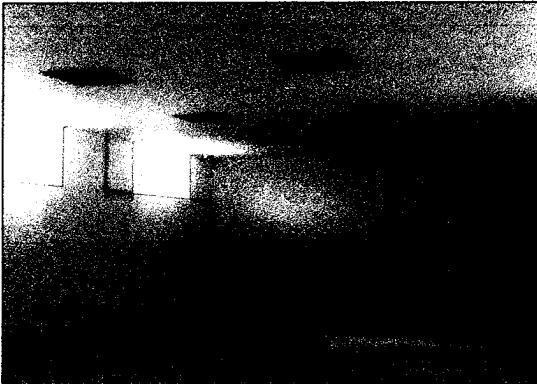


Foto No. 11 Fecha: 25/09/2015
PERFORACION HUECOS PARA LAMPARAS



Foto No. 12 Fecha: 26/09/2015
PINTURA GRIS BASALTO

	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CÓDIGO			
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA		VERSIÓN		
	INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA		PÁGINA	1	DE
	DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	FECHA	3	10	2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional , Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015

Semana Número: 12 Del: 28/09/2015 Al: 03/10/2015

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 81 Días

Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.

CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

Obra programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
	17,42	84,01		17,42	84,01
Valor básico de la Obra	\$ 23.688.453	\$ 114.266.171	Valor básico de la Obra	\$ 23.688.453	\$ 114.266.171

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	LEONEL VALERO ESCALANTE	Interventor:	
Contrato No.	1591/2015	Contrato No.	1591/2015
Valor Inicial:	\$ 178.995.987,00	Valor Inicial:	\$
Valor Actualizado:	\$	Valor Actualizado:	\$
Plazo Inicial:	Tres (3) meses	Plazo Inicial:	Tres (3) meses
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	15 de julio del 2015	Fecha de Iniciación:	15 de julio del 2015
Fecha de Vencimiento:	15 de octubre del 2015	Fecha de Vencimiento:	15 de octubre del 2015


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades, instalacion de espejo biselado 4mm de 13,60*1,65; instalacion de ventanas en vidrio de 1,80*2,99, total 2 unidades
instalacion de ventanas de vidrio de 1,90*90, total 4 unidades; instalacion de puerta de vidrio acceso al salon de 2,50*2,78 ; instalacion de piso laminado 110 m2.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: instalacion de marcos para lamparas; instalacion de lamparas led 60*60; instalacion lampara redonda; instalacion de tomacorrientes dm polo/tierra; instalacion de reflector de poste metalico espacio peatonal.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
se evidencia un retraso de la obra al no llegar el suministro de aires acondicionados, pasamanos metalico, cacaemos puerta metalica para el locker.	 Firma _____ Nombre: ING WILLIAM LEGUIZAMON Matricula No. 5420207923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12 03 DE OCTUBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA
		1 DE 1



Foto No. 01 Fecha: 29/09/2015
ESPEJO BISELADO 4MM

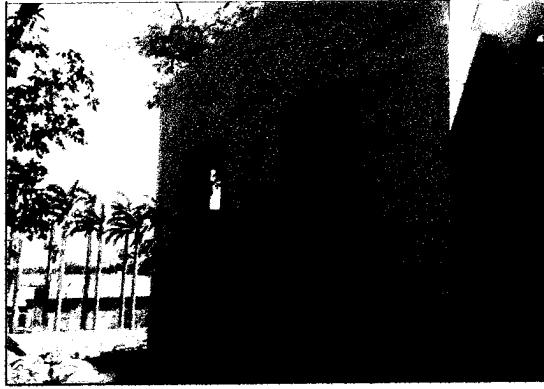


Foto No. 02 Fecha: 29/09/2015
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS VIDRIO 1.80*2.69



Foto No. 03 Fecha: 29/09/2015
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS VIDRIO 11.60* .90

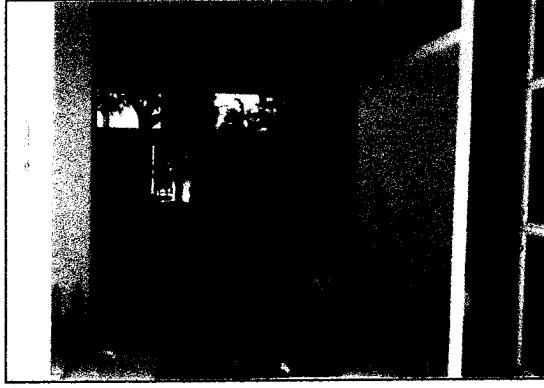


Foto No. 04 Fecha: 30/09/2015
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 2.50 2.79"



Foto No. 05 Fecha: 02/10/2015
INSTALACION DE ESPUMA SUPERLON

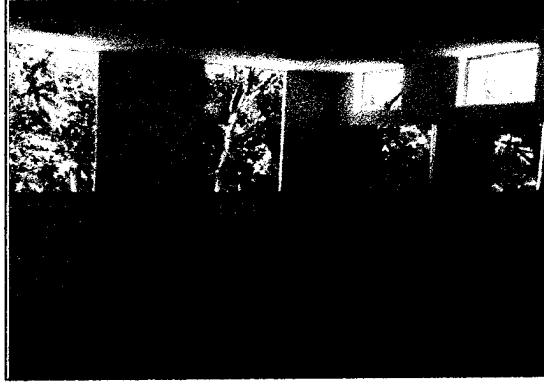


Foto No. 06 Fecha: 04/10/2015
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	CÓDIGO			
	VERSIÓN			
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA		PÁGINA	1	DE
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA			1	

DEPENDENCIA EJECUTORA: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FECHA 10 10 2015

UBICACIÓN: Autopista Internacional , Villa del Rosario - Norte de Santander CONTRATO No: 1591/2015
 Semana Número: 13 Del: 05/10/2015 Al: 10/10/2015
 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 88 Días
 Supervisor de Contrato Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO, UNIVARSIDAD DE PAMPLONA.
 CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA
 EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) 4,47	88,48	Obra Física Ejecutada (%) 4,47	88,48
Valor básico de la Obra \$ 6.084.364	\$ 120.350.535	Valor básico de la Obra \$ 6.084.364	\$ 120.350.535

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: LEONEL VALERO ESCALANTE
 Contrato No. 1591/2015
 Valor Inicial: \$ 178.995.987,00
 Valor Actualizado: \$
 Plazo Inicial: Tres (3) meses
 Plazo Actualizado:
 Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:
 Contrato No. 1591/2015
 Valor Inicial:
 Valor Actualizado: \$
 Plazo Inicial: Tres (3) meses
 Plazo Actualizado:
 Fecha de Iniciación: 15 de julio del 2015
 Fecha de Vencimiento: 15 de octubre del 2015


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante esta se realizaron actividades, instalacion de marcos de lamparas de 60*60 , 15 unidades; instalacion de tomacorriente; instalacion de lamparas led de 60*60, 15 unidades; salida voz y datos; salida HDMI; instalacion de lampara led redonda; instalacion de reflector espacio peatonal.






ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la siguiente semana según la programacion del contratista se realizaran las siguientes actividades: Instalacion de guarda escobas ; instalacion de carcamos; instalacion de aires acondicionado; pasamanos metalico; instalacion de puerta metalica para el locker. aseo y retiro de escombros.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
se evidencia un retraso en la obra, por material de aires acondicionados; y por la elaboracion de pasamanos metalico y puerta del locker.	 Firma: _____ Nombre: ING. WILLIAM LEGUIZAMÓN Matrícula No. 542020/923 NTS

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA DE VISITA

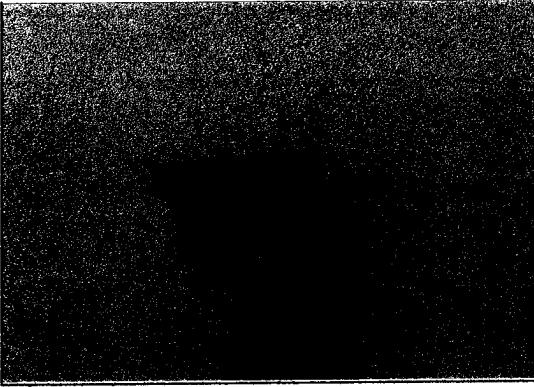	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13 10 DE OCTUBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA
1	DE	2
		
Foto No. 01 Fecha: 6/10/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS DE LAMPARAS	Foto No. 02 Fecha: 6/10/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED 60*60	
		
Foto No. 03 Fecha: 6/10/2015 SALIDA VOZ Y DATOS	Foto No. 04 Fecha: 6/10/2015 SALIDA HDMI	
		
Foto No. 05 Fecha: 6/10/2015 SALIDA DE TOMACORRIENTE DM POLO/TIERRA	Foto No. 06 Fecha: 6/10/2015 INTERUPTOR DOBLE SALIDA DE ILUMINACION 15 LAMPARAS 60*60	

	<p align="center">REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA</p>	<p align="right">INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13 10 DE OCTUBRE DE 2015 VERSIÓN 0</p>
	<p align="center">CONTRATO DE OBRA No.1691 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESION CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES EN LA EXTENSION DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.</p> <p align="center">UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER</p>	




Foto No. 07 Fecha: 8/10/2015
SALIDA DE ILUMINACION SENCILLO LAMPARA REDONDA




Foto No. 08 Fecha: 8/10/2015
TABLERO DE 12 CIRCUITOS

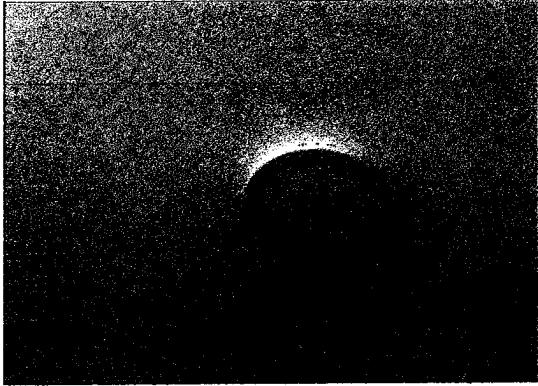


Foto No. 09 Fecha: 8/10/2015
SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED REDONDA



Foto No. 10 Fecha: 8/10/2015
TRANSLADO DE REFLECTOR DE POSTE DE LUZ METALICO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 14 15 DE OCTUBRE DE 2015 VERSIÓN 0
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.	
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER		PAGINA 1 DE 2

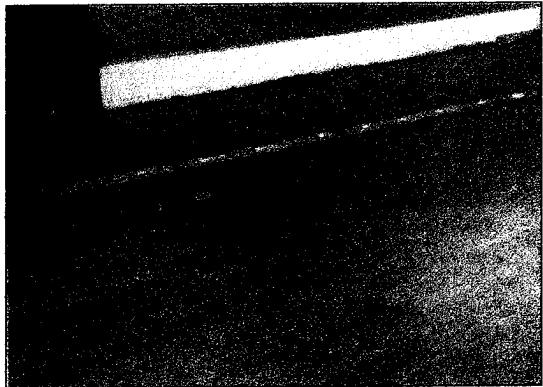


Foto No. 01 Fecha: 13/10/2015
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA



Foto No. 02 Fecha: 13/10/2015
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA

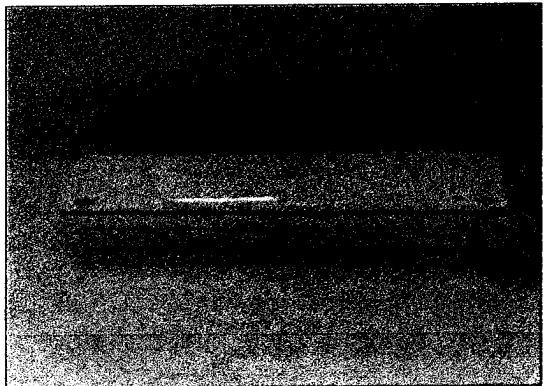


Foto No. 03 Fecha: 13/10/2015
AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU

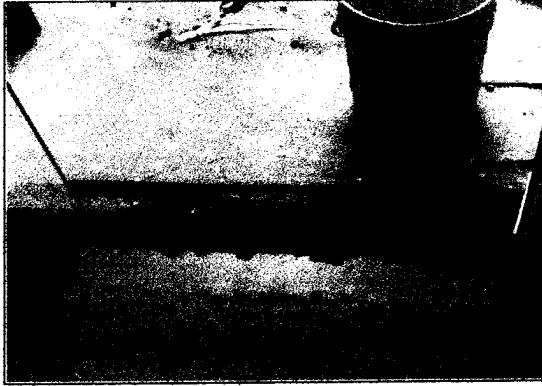


Foto No. 04 Fecha: 13/10/2015
PISON QUEMADO ACCESO AL SALON

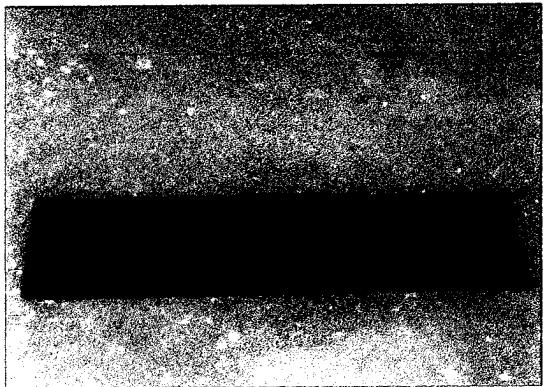


Foto No. 05 Fecha: 12/10/2015
CARCAMO METALICO 1.32°.31



Foto No. 06 Fecha: 12/10/2015
CARCAMO METALICO .80°.20

	REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 14 15 DE OCTUBRE DE 2015 VERSIÓN 0	
	CONTRATO DE OBRA No.1591 DE 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EXPRESIÓN CORPORAL PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ENFOQUE EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA EXTENSIÓN DE VILLA DEL ROSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.			
UBICACIÓN: AUTOPISTA INTERNACIONAL VÍA LOS ÁLAMOS VILLA ANTIGUA, VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER			PAGINA	
		2	DE	2

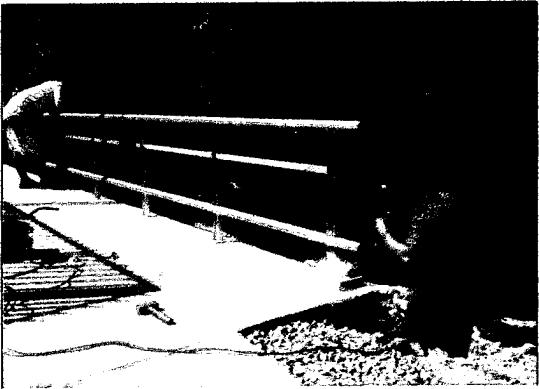


Foto No. 07 Fecha: 14/10/2015
PASAMANOS METÁLICO



Foto No. 08 Fecha: 14/10/2015
PUERTA METÁLICA PARA LOCKER



Foto No. 09 Fecha: 14/10/2015
ASEO GENERAL



Foto No. 10 Fecha: 14/10/2015
ASEO GENERAL
